EQUIPAMENTO:
ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MILLIPORE

TAG:
MIQ005

TESTES DE FUNCIONAMENTO E DE DESEMPENHO REALIZADOS APÓS A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Especialista responsável pelo serviço:

MATEUS CARREIRA LIMA

Data: **28/05/2025**

QPack Soluções Analíticas Ltda.
Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 – Comercial Vitoria Martini – Indaiatuba – SP
CEP: 13347-630 - www.qpack.com.br - Fone: 55 (19) 2660-1110
E-mail: qpack@qpack.com.br

1. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO:	**ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MILLIPORE**
TAG:	**MIQ005**
MODELO:	**MILLI-Q IQ 7015**
NÚMERO DE SÉRIE:	**F1HB68098**
LOCAL INSTALADO:	**CONTROLE DE QUALIDADE**

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

Empresa:	**PRATI DONADUZZI E CIA LTDA**
Endereço:	**RUA MITSUGORO TANAKA, N° 145 - CENTRO INDUSTRIAL NILTON ARRUDA - TOLEDO/PR - CEP 85903-630**
Nome do contato:	**LÚCIA MERGEN**
Função:	**ANALISTA DE MANUTENÇÃO**

3. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR

Executado por:	**MATEUS CARREIRA LIMA**
Função:	**ENGENHEIRO MANUTENÇÃO**
Data:	**28/05/2025**

4. IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PADRÕES UTILIZADOS

Registre na tabela a seguir todos os instrumentos e padrões que forem utilizados.

Identificação	Descrição	Número de Série / Lote
CD-05	**CONDUTIVÍMETRO**	**77159**

5. TESTES DE FUNCIONAMENTO

Este procedimento descreve e registra os testes de inicialização, operação e funcionamento do equipamento.

Se necessário, utilizar o manual do fabricante.

Passos de avaliação	Procedimento	Aprovado		
		Sim	Não	N/A
Ligando o equipamento	Ligar o equipamento e observar se ele começa o procedimento de inicialização.	☒	☐	☐
Processo de inicialização	Verificar se o equipamento realiza todas as etapas de inicialização sem apresentar erros ou mensagens de erros.	☒	☐	☐
Funcionalidade	Executar as funções de operação sem apresentar erros de funcionamento.	☒	☐	☐

Observação:

6. TESTES DE DESEMPENHO


Este procedimento descreve e registra os testes de desempenho do equipamento.
Se necessário, utilizar o manual do fabricante.

Procedimento do desempenho do equipamento		Aprovado		
		Sim	Não	N/A
Teste de Desempenho	Leitura da Qualidade da Água Produzida.	☒	☐	☐

Observação:

7. EVIDÊNCIAS FOTOGRAFICAS:

As evidências fotográficas anexadas a este documento foram coletadas meticulosamente para garantir sua integridade e autenticidade.

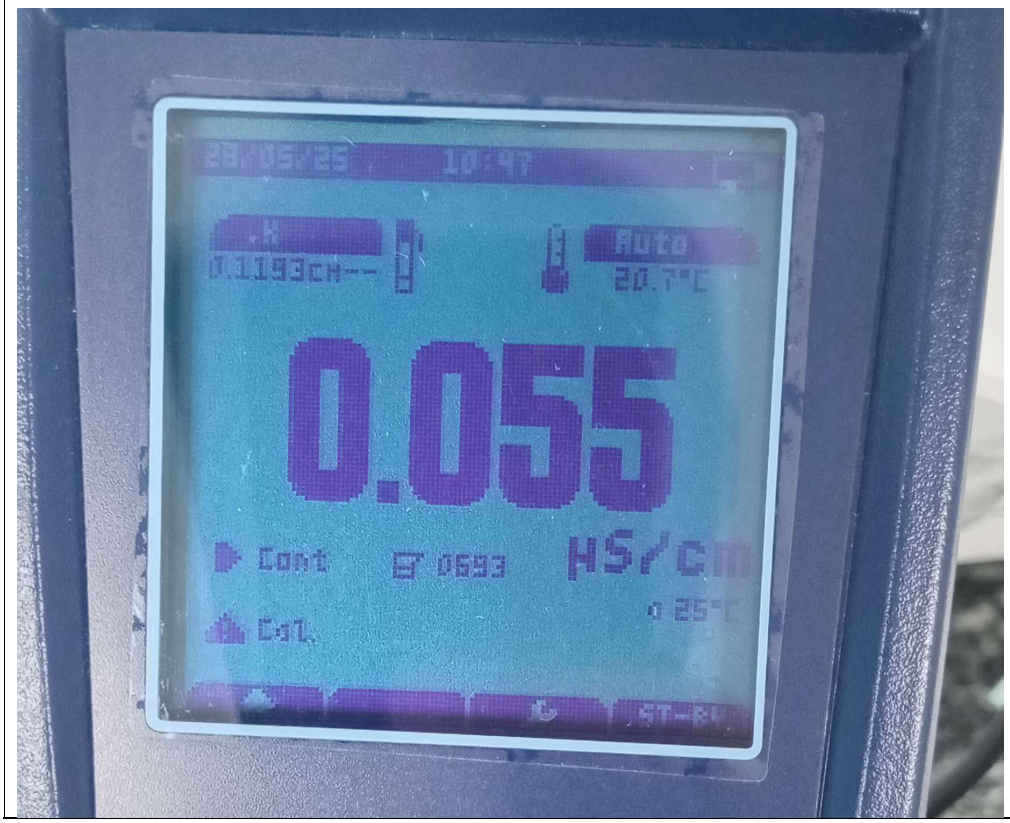


0.066
Cont
µS/cm
Cal.

8. Assinaturas

As assinaturas abaixo confirmam a realização dos testes de funcionamento e de desempenho e os seus respectivos resultados satisfatórios.

APROVADO POR:	**MATEUS CARREIRA LIMA**	**Assinatura:**
EMPRESA:	**QPACK SOLUÇÕES ANALÍTICAS**	
DEPARTAMENTO:	**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**	
FUNÇÃO:	**ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO**	

APROVADO POR:		**Assinatura:**
EMPRESA:		
DEPARTAMENTO:		
FUNÇÃO:		
